一 / 作品概述

凭据不出域的跨组织故障协同

本系统面向由应用、数据库和入口运维共同维护的订单业务。协调入口组织任务、汇总证据并取得人工审批；资源方独立持有凭据、校验调用和执行操作；业务验证方沿公共入口核验订单流程与原请求回执。

> **技术报告开发稿**
> 本稿按官方七章组织，证据截至仓库 634c46d。本轮正式平台验收 22 例中 18 通过、4 失败；修复后的平台复验、官方日志入库、独立新机器与长期运行仍待完成。失败和缺失记录作为结果保留。

三项实现

实现	作用
可接续群组任务	持久任务、操作账本和隔离令牌，区分已应用、未执行和效果未知。
MCP 到 AIP 网关	把本域工具接到统一身份与任务协议；工具白名单、审批和资源约束留在本域。
证据驱动协调	按局部事实调整探测与修复顺序；模型假设受结构化校验与预算约束。

实验结论按各自冻结版本呈现。当前代码中的独立修复，不追溯改判原实验；新健康流程也不消除旧未知订单。

二 / 需求分析

互联需要共享事实，也需要保留权限边界

跨组织排障常把多个资源凭据集中交给一个执行者，或依赖群聊逐步转述。前者扩大权限暴露，后者缺少可执行的任务契约和可核验的操作记录。异构工具还缺少统一的身份、发现和协作语义。


订单创建、查询、取消构成可验证业务。请求键与回执在同一事务保存；失去响应时沿原键查证，无法确认则保留人工核对，避免把服务恢复等同于原业务完成。

需求	验收方式	当前证据
功能	发现、描述确认、跨域任务、修复及订单验证	七个新版身份与正式 AMQPS 案例；逐例结果分列。
性能	同场景、同模型、同工具和预算比较	NEW7 E3 45 格，含 8 格未确认和模型成本。
兼容	复用官方模型、身份断言、AMP 签名	SDK 改造和官方本地 suite；平台入库另验。
部署	脚本、固定镜像、隔离目标和恢复记录	本机多次部署已测；新机器 15 分钟尚未验证。
安全	拒绝越权、审批绑定、旧令牌与凭据扫描	已有实现及分项证据；完整逐条策略审计在独立验证。

调研依据为项目平台适配记录、官方附件与开源教程。本稿没有新增访谈、用户试点或社会效益测量，不把预期受益写成已发生的效果。

三 / 技术选型与方案设计

五类角色分担协作与执行责任

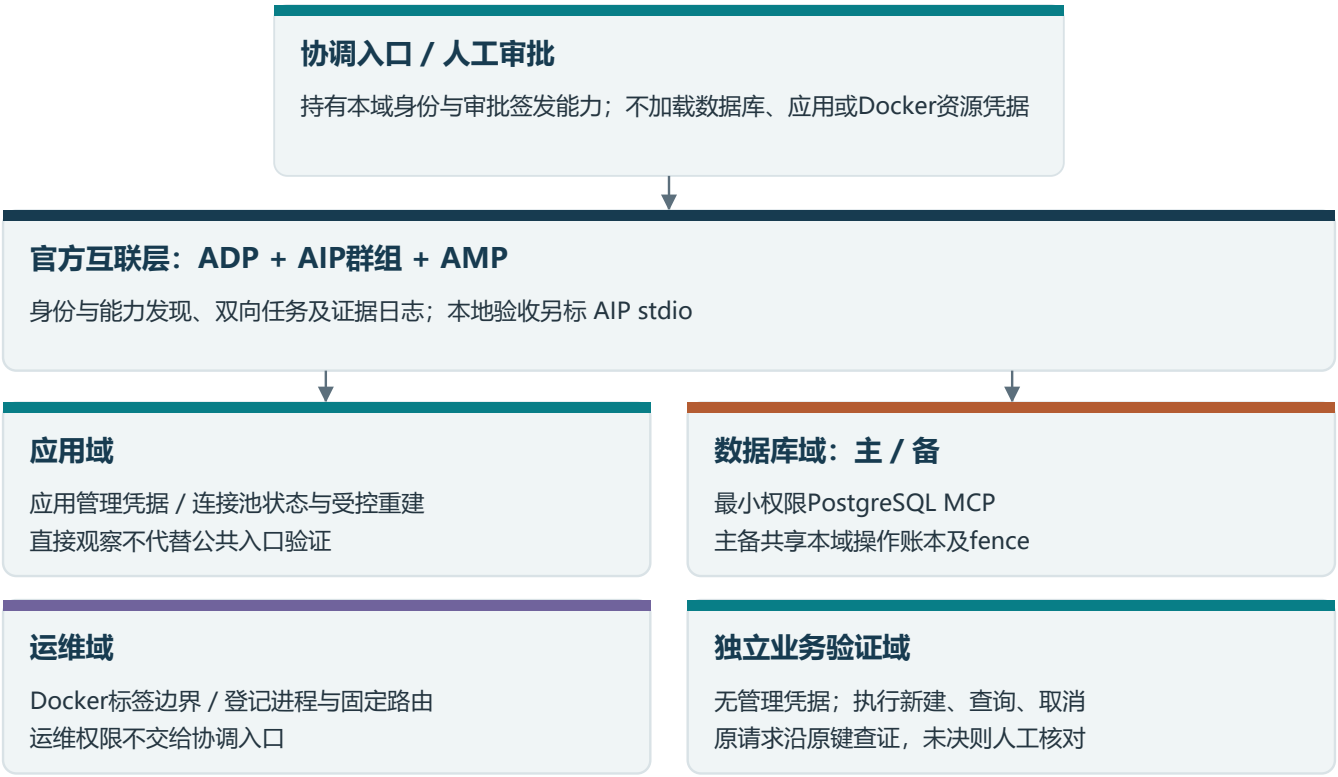

官方 SDK 提供身份、能力发现、AIP 群组和 AMP 基础模块。项目新增群组 access 钩子、接续模块和 MCP 网关；应用与验证模块实现订单数据契约。公开能力描述用于候选筛选，随后按实际资源范围进行 describe 确认。

边界	执行规则
远程工具	远端只提交注册别名和受 schema 限制的参数，不提交资源口令或任意 SQL。
资源修改	write/high 必须携带操作标识与 fence；high 还需精确绑定调用方和动作的审批证明。
证据	局部事实包含来源和观测时间；过期事实不因接续重新变新。

四 / 项目实施

先保存状态，再决定能否继续修改



结果未知：先核验，不能盲目再做

执行中断可能已经生效。查询真实资源：若已满足后置条件，则登记 reconciled_applied；无法证明则保持unknown / reconciliation_required，停止自动修改并交人工。新fence只阻断旧令牌，不证明旧动作没有发生。

同一资源域的主备共享操作账本。已应用操作返回已有结果；记录为 received 的操作才允许在新 fence 下继续；效果未知时先查真实后置条件，无法证明则保持未知。旧主恢复后，新隔离令牌阻止它继续使用原请求修改资源。

实施环节	具体实现与验证
MCP 接入	复用 stdio 客户端与工具目录；网关完成别名映射、数据规范化、超时和审计。
调度与审批	事实驱动任务图；同资源修改串行，人工审批记录随任务下发；工作台展示证据、动作和接续。
正式验收	固定源码、镜像、计划和隔离端口；串行故障与恢复，保存真实退出码并检查独立 H00。
兼容修复	full_history 接受合法的可选 session 元数据；拒绝响应 operation=null 时保留原因。39 个不同离线方法通过。

独立修复提交 2b4e28b；原 22 例冻结源码 c1c09e5。修复未部署到该批镜像，离线通过不等同于平台复验通过。

五 / 应用成效 • 实验结果

45 格对照与 22 例接续验收分别统计

NEW7 E3 方法	确认持续恢复	结果解释
M0 固定流程	15 / 15	无模型调用；作为当前冻结版本的参照。
M1 自由工具	7 / 15	8 格未确认均涉及 POST 前预算拒绝，失败完整保留。
M2 完整方案	15 / 15	五场景总协调耗时中位数均高于 M0，不宣称全面更快。

E3 共记录 277 次模型调用、648020 tokens，usage 完整。旧 workload 仍有 7 个未完成意图阶段，独立原键 GET 全部返回 404，不能据此证明未执行。最终新 H00 的健康结果不能解除这些旧阶段。

本批平台验收	范围	例数	通过	失败
E1-a	三断点退出接续	9	8	1
E1-b	三种交接方式	9	6	3
E1-c	旧主同进程复活	3	3	0
F12/E5	原请求回执对照	1	1	0

4 例失败的含义

首次 E1-a 在环境退出后中断；三次 E1-b full_history 暴露交接元数据不兼容及拒绝原因解析问题。原失败不重试覆盖；环境恢复、后续独立健康与源码修复分开留证。

来源：evidence/new7-e3-45-20261018-first/；evidence/platform-acceptance-20261019/。E3 外层 exit1 与本批分阶段退出码均保留。

五 / 应用成效 · 平台与审计

成功任务、发送字节和完整记录是不同指标

首轮交接方法	完整 IFC 字节	handover 子对象	实验与确认
from_scratch	1162	338	通过，有确认
full_history	18164	17340	失败，无确认
resume_package	30591	15046	通过，有确认

上述为各方法首轮实际发送捕获。resume_package 同时出现在两个参数位置，因此子对象大小不能代表完整传输大小；publisher 返回也不等于替代方确认。三次重复的独立值见原汇总，不从这一张表推出字节节省。

检查	当前结果	覆盖边界
T62 凭据扫描	214 文件、68 已知值；原文/解码命中及解析错误均为 0	本批捕获和六域快照完整；不代替全部 broker 或管理消息检查。
T05 访问对账	289 Start，预期 578、实际 560；缺 18 条	3 个 E1-c 与 F12 双端匹配；严格闭合检查未通过，不补造记录。
生命周期	21 例有中断任务，F12 完整	任务中断与 access 双端匹配分别列出。
运行收尾	本批项目运行容器 0；保活进程 exit0	只说明本批所有权范围，不推断其他应用的状态。

旧 E3 的 T62 曾有 11 条坏行，原 overall=false 不由本批零错误改判。Kafka、Monitor 验签/查询、后台访问量及长期在线仍需独立平台证据。

六 / 总结与展望

已验证互联路径，继续补齐失效与交付闭环

真实运行证明：各域可以在本域保留工具与凭据，经正式通信组织订单恢复；接续、旧主隔离和原键业务核对已有独立案例。同时，完整历史契约错误、模型预算拒绝、旧未知意图与缺端日志暴露了系统边界，仍需按各自证据解决。

下一项	完成判据
交接修复复验	新源码、镜像和计划绑定后重新验证；不能挪用原 22 例结论。
访问记录缺端	逐条查明记录时序和进程终止窗口，保留不确定性；不提前记录成功。
完整策略审计	四类越权请求逐条拒绝、逐条签名 audit、无资源修改；平台身份认证与 Monitor 分别验证。
新机器部署	独立机器按公开步骤 15 分钟部署并一次跑通 F10。
平台入库与稳定性	取得真实 Kafka/TLS 与 Monitor 权限，验证入库及连续 24 小时无人工干预。
正式演示与材料	录制注册、发现、互联和后台数据；按最终事实更新报告、佐证和匿名检查。

标准化建议包括：明确接管的未知效果语义与 fence、工具能力的资源范围、可关联的调用审计，以及任务进入处理后突然中断时的可观察性。这些建议来自当前工程与失败证据，不作为新的标准条款。

本稿不包含新的 PPTX、正式视频或未取得的用户反馈。平台访问排行、长期在线率和落地收益尚无相应终态数据。

七 / 附录

复现入口与证据版本

材料	位置或状态
完整代码与团队开发	GitHub: RoboSynth/multi-agent-interconnect；本稿源提交 634c46d。
平台 22 例	evidence/platform-acceptance-20261019/summary.json、batch-terminal.json、reviews.json
独立交接修复	evidence/handover-wire-fix-20261019/verification-summary.json、peer-review.json
NEW7 E3 45 格	evidence/new7-e3-45-20261018-first/，含模型调用、旧意图及坏行限制。
环境与操作	docs/本地开发环境与操作_20261018.md；docs/开发者接手指南_20261018.md
官方基础与教程	vendor/ACPs-community/acps-docs/；原生代码、改造与新增模块按贡献说明区分。
正式报告大纲	research/other-tracks/官方附件/附件2AIC·智能体互联技术报告参考大纲.pdf
公开贡献快照	两个 draft PR、四条 Issue 已提交的记录见 evidence/upstream-public-submission-20261018/。
本稿生成与来源	同目录 build.py、content.json、evidence.json；来源 SHA 与渲染检查另存。

使用范围

这是随当前证据更新的开发稿。缺少的新机器、平台后台、长期窗口和正式材料仍列为待完成，不能据本 PDF 宣布完整 P0 或赛事必要验证全部完成。

参考内容使用仓库已保存的官方附件、教程、项目源码和闭合运行资料。引用路径均为项目相对路径；私钥、真实 env、审批证明和未审原消息不进入本稿。
